

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

60016 – Drogi publiczne gminne

10 076 235,54

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Budowa chodników przy drogach powiatowych	125 000,00	124 749,89	99,80%	Wykonano i przekazano Powiatowi w formie pomocy rzeczowej chodnik długości 421m z płyt drogowych przy drodze powiatowej w Przećminie. Wykonano też dokumentację projektową chodnika (ciągu pieszo-rowerowego) przy drodze powiatowej Kołobrzeg - Korzystno. Wydatki niewygasające – 40.000,00 zł
Budowa chodników przy drogach powiatowych (dotyczy wydatków niewygasających w 2012r.)	21 891,00	21 891,00	100,00%	Wydatki dotyczą rozliczenia końcowego inwestycji budowy chodników przy drogach powiatowych w Drzonowie. Ze względu na zbieg egzekucji prowadzonej w stosunku do wykonawcy zadania środki z wydatków niewygasających zwrócono do budżetu a następnie wypłacono częściowo wykonawcy i częściowo wplacono do Urzędu Skarbowego
Budowa dróg gminnych z płyt drogowych	850 000,00	640 493,36	75,35%	Zaprojektowano i wykonano drogi gminne z płyt drogowych długości łącznej 1628,1m w Bogucinie, Korzystnie (ul. Lubczykowa), Nowogardku, Grzybowie (ul. Łąkowa, Nadmorska, Polna, Przybrzeżna) i Budzistowie (ul. Stare Miasto). Wydatki niewygasające – 320.000,00 zł

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Przebudowa Alei Południowej w Dźwierzynie	15 000,00	14 907,60	99,38%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi
Przebudowa chodnika w Kądzielnie	61 000,00	60 974,80	99,96%	Wybudowano chodnik długości 250m z kostki betonowej brukowej.
Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie	30 000,00	24 100,00	80,33%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi. Wydatki niewygasające – 18.500,00 zł
Przebudowa drogi w Rościęcinie	1 540 000,00	1 536 909,57	99,80%	Zaprojektowano i wybudowano jezdnię długości 792,5m z asfaltu, chodnik długości 833m i zjazdy z kostki betonowej.
Przebudowa dróg z płyt w Bogucinie, Budzistowie, Błotnicy, Grzybowie, Karcinie, Korzystnie, Niekaninie, Obrotach, Przecminie, Stramnicy i Zieleniewie	2 460 000,00	2 456 184,68	99,84%	Zaprojektowano i wykonano drogi gminne płyt drogowych długości łącznej 6728,5m w Bogucinie, Korzystnie (ul. Aroniowa)), Grzybowie (ul. Wiosenna, Kotwiczna, Masztowa, Towarowa, Handlowa, Malinowa, Myśliwska, Konwaliowa, Jagodowa, Gajowa, Polna, Wrzosowa, Żurawinowa, Akacyjowa, Klonowa, Ogrodowa), Niekaninie (ul. Śliwkowa i Świerkowa), Budzistowie (ul. Stare Miasto), Obrotach, Zieleniewie (ul. Wypoczynkowa i Herbowa), Karcinie, Błotnicy i Stramnicy.
Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	250 000,00	247 599,00	99,04%	Wykonano jezdnię z polbruku wraz z kanalizacją deszczową, bez chodnika o długości 227 m. Przy ulicy pozostał chodnik i oświetlenie wykonane przez prywatnego inwestora.
Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwierzynie	15 000,00	7 453,80	49,69%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi
Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	12 000,00	4 969,20	41,41%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	30 000,00	18 487,10	61,62%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy dróg
Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi. Wydatki niewygasające – 10.000,00 zł
Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	316 000,00	315 363,77	99,80%	Wykonano jezdnię długości 180m z polbruki wraz z kanalizacją deszczową, bez chodnika.
Przebudowa ul. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie	90 000,00	1 230,00	1,37%	Wykonano koncepcję z wyceną szacunkową kosztów przebudowy drogi
Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	180 000,00	170 502,00	94,72%	Wykonano jezdnię z polbruki wraz z kanalizacją deszczową o długości 105 m. Wykonano też chodnik –dojście do ul. Borkowskiej długości 45m i przepust na rowie.
Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	1 000 000,00	974 050,84	97,41%	Wykonano jezdnie 3 dróg gminnych o łącznej długości 626m z kostki betonowej brukowej wraz z kanalizacją deszczową, bez chodników.
Przebudowa ul. Poziomkowej w Korzystnie	230 000,00	219 797,22	95,56%	Wykonano dokumentacja projektową i wybudowano jezdnię z kostki betonowej brukowej długości 111,5m wraz z kanalizacją deszczową. W ramach inwestycji wykonano też oczyszczenie 150m rowu do którego odprowadzana jest deszczówka.
Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie	1 390 000,00	1 384 709,77	99,62%	Wykonano odcinek 660,6m jezdni z jednostronnym chodnikiem i parkingiem, wraz z kanalizacją deszczową, oraz 125m odcinek z płyt betonowych ażurowych.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Przebudowa ul. Szałwiowej w Korzystnie	10 000,00	4 969,20	49,69%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi
Przebudowa ul. Sliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Zieleniewie	1 153 280,00	1 123 473,32	97,42%	Wykonano jezdnie 4 dróg gminnych o łącznej długości 617m z kostki betonowej brukowej wraz z kanalizacją deszczową, bez chodników.
Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	463 000,00	454 061,89	98,07%	Wykonano jezdnie 2 drogi gminne o łącznej długości 350m z kostki betonowej brukowej wraz z kanalizacją deszczową, bez chodników.
Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	25 000,00	10 000,00	40,00%	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi. Wydatki niewygasające – 10.000,00 zł
Wykonanie dokumentacji przebudowy chodnika w miejscowości Stramnica	40 930,00	14 000,00	34,20%	Wykonano dokumentację projektową budowy chodnika i przekazano Powiatowi w formie pomocy rzeczowej
Zakup wiat przystankowych	20 000,00	10 599,99	53,00%	Zakupiono 4 wiaty przystankowe do miejscowości gminnych
Przebudowa drogi powiatowej w Karcinie	280 000,00	224 757,90	80,27%	Udzielono pomocy finansowej Powiatowi na wykonanie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej na odcinku 800m.
Sołectwo Niekanin - Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	18 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

63095 – Turystyka – pozostała działalność

1 177 647,29

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	70 000,00	54 612,00	78,02%	Wiosną wykonano dokumentację tymczasowego (do czasu wykonania ostróg na tym odcinku plaży) zejścia. W wyniku przyspieszenia decyzji o budowie przez Urząd Morski ostróg w 2014r., zrezygnowano z budowy zejścia tymczasowego. Zaprojektowano docelowe dojście z polbruku do terenu plaży w miejscu bez klifu, uwzględniające wymogi dla niepełnosprawnych, i dodatkowo zaprojektowano punkt widokowy w miejscu istniejącego chodnika, który prowadził do zniszczonego starego zejścia.
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie	1 020 000,00	988 035,29	96,87%	Zaprojektowano i wybudowano ścieżkę rowerową długości 1897m z kostki betonowej brukowej, kładkę nad rzeką Wielki Rów i przepust z rur betonowych. W ramach inwestycji posadzono też 270 szt. drzew i 698 szt. Krzewów
Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej	1 100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Morski nie przekazał Gminie dokumentacji, na podstawie której miało być wykonanie zejście - zjazd techniczny. Nie odpowiadał też na monity w tej sprawie i nie dokonano wspólnych uzgodnień.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie	135 000,00	135 000,00	100,00%	Udzielono pomocy finansowej dla Województwa na wykonanie odcinka ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie na odcinku 638 m
--	------------	------------	---------	---

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **424 330,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Wykup gruntów	630 000,00	424 330,00	67,35%	Wydatki poniesione na nabycie gruntów pod drogi i wypłata odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

72095 – Informatyka, pozostała działalność 6 600,00

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. Informatyzacji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	6 600,00	6 600,00	100,00%	Wdrożono i udostępniono System Informacji Przestrzennej. Rozpoczęto indywidualne szkolenia z pracownikami. Zasilono system danymi przekazanymi przez Gminę Kołobrzeg.

75023 – Urzędy Gmin 39 975,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat budżetu i Finansów

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Zakup wpłatomatu	40 000,00	39 975,00	99,94%	Zakupiono urządzenie – wpłatomat na potrzeby poboru opłaty skarbowej, w związku z likwidacją kasy gminy.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

289 844,00

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Zakup motopompy dla OSP	23 000,00	0,00	0,00%	Z powodu nie przyznania dotacji z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP realizację zakupu przeniesiono na 2014 rok
Zakup wozu strażackiego	277 869,00	267 713,00	96,35%	
Sołectwo Głowaczewo - zakup wozu strażackiego	9 466,00	9 466,00	100,00%	Dotacja dla OSP Karcino - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Karcino
Sołectwo Karcino - zakup wozu strażackiego	12 665,00	12 665,00	100,00%	

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

80101 – Oświata i wychowanie

204 593,66

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Modernizacja nawierzchni placów i chodników na terenie szkół w Drzonowie	170 000,00	165 149,06	97,15%	Zaprojektowano i wykonano nawierzchnie placów mi chodników z kostki brukowej na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum o powierzchni 1200 m2. Wykonano też parking z płyt ażurowych na terenie gimnazjum oraz wstawiono nową furtkę pomiędzy szkołą podstawową i gimnazjum.

Dysponent części budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Zakup centrali telefonicznej do Szkoły Podstawowej w Drzonowie	5 000,00	4 944,60	98,89%	Zakup centrali telefonicznej, montaż do istniejącej sieci wewnętrznej oraz zaprogramowanie systemu i uruchomienie centrali.
Zakup monitoringu do Szkoły Podstawowej w Drzonowie	35 000,00	34 500,00	98,57%	Dostawa i instalacja urządzeń do monitoringu wizyjnego obejmującego teren Szkoły Podstawowej i boiska przyszkolnego oraz wejścia do Gimnazjum i budynku Gimnazjum w Drzonowie

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

85195 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. Społecznych i Profilaktyki Przeciwalkoholowej

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi	50 000,00	50 000,00	100,00%	Udzielenie dotacji na realizację zadania: Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1 968,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	2 230 000,00	1 968,00	0,09%	Od 2012r. trwała procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskano kolejno decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodno-prawnego. Ostatecznie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji została wydana pod koniec listopada 2013r. Konsekwencją tego był brak możliwości wykonania robót w 2013r. Wykonano jedynie aktualizację kosztorysów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu i przygotowano przetarg. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

90003 – Oczyszczanie miast i wsi **13 899,00**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Zakup pługa odśnieżnego	16 000,00	13 899,00	86,87%	Pług odśnieżny strzałkowy dwuskrzydłowy o szerokości 3 metrów roboczych do ciągnika Zetor

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **145 258,81**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Budowa oświetlenia dróg w Głowaczewie	60 000,00	31 341,49	52,24%	Wybudowano 8 lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej na odcinku 230 m
Budowa oświetlenia dróg w Nowogardku	60 000,00	39 975,00	66,63%	Wybudowano 7 lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej i gminnej na odcinku łącznej długości 580 m
Budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Zieleniewie	130 000,00	73 942,32	56,88%	Wybudowano 24 lampy oświetleniowe przy drodze gminnej na odcinku 750 m

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

90095 – Pozostała działalność **2 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Budowa szaletu przy ul. J. Krasickiego w Dźwirzynie	10 000,00	0,00	0,00%	Nie wykonano dokumentacji szaletu, ponieważ dojścia do plaży z ul. J.Krasickiego leży na terenie prywatnym. Rozpoczęto działania mające na celu zakup terenu i wykonanie nowego estetycznego i funkcjonalnego dojścia do plaży wraz z remontem toalety w 2014r.

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Dotacja dla Powiatu Kołobrzieskiego - zakup broni pneumatycznej	2 000,00	2 000,00	100,00%	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzieskiego na zakup broni pneumatycznej do usypiania zwierząt dzikich.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

650 888,68

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Rościęcinie	500 000,00	413 868,47	82,77%	Zaprojektowano i wybudowano budynek świetlicy o pow. użytkowej 147,6 m ² , w którym znajduje się pomieszczenie kuchenne, sala, hol, 2 toalety, pomieszczenie gospodarcze z piecem gazowym i magazynek. Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania. W ramach inwestycji wykonano też parking, oświetlenie zewnętrzne i zakupiono pierwsze wyposażenie.
Modernizacja budynku świetlicy w Zieleniewie	150 000,00	125 404,39	83,60%	Wykonano dokumentację projektową i zmodernizowano budynek świetlicy, przystosowując go do wymogów punktu przedszkolnego. Remont obejmował salę po byłej kaplicy, toalety, kotłownię i korytarz
Rozbudowa budynku przy świetlicy w Grzybowie	120 000,00	103 344,63	86,12%	Wykonano dokumentację projektową i wykonano rozbudowę i remont budynku przy świetlicy. Dobudowano szatnię, wymieniono dach podwyższając pomieszczenia. W sali wbudowano dodatkowe okno i wykonano aneks kuchenny

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Sołectwo Budzistowo	5 300,00	4 629,96	87,36%	zakup telewizora do świetlicy w Budzistowie
Sołectwo Drzonowo	4 330,00	3 641,23	84,09%	zakup telewizora do świetlicy w Drzonowie
92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa – pozostała działalność				29 931,20

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Sołectwo Nowy Borek	8 782,00	8 342,90	95,00%	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
Sołectwo Sarbia	11 314,00	10 748,30	95,00%	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
Sołectwo Stary Borek	10 840,00	10 840,00	100,00%	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

92601- Obiekty Sportowe

187 023,36

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Budowa ogrodzenia boiska w Zieleniewie	66 670,00	22 370,55	33,55%	Wykonanie dokumentację Projektowa i wybudowano ogrodzenie panelowe długości 216m, ustawiono piłko chwyty wysokości 5m i 3m łącznej długości 51m. Boisko wyposażono w sprzęt sportowy do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz ławki.
Sołectwo Zieleniewo - budowa ogrodzenia boiska w Zieleniewie	33 330,00	33 330,00	100,00%	

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania	15 000,00	15 000,00	100,00%	Instalację automatycznego nawadniania rozbudowano o część wokół kortów tenisowych
Rozbudowa zadaszenia amfiteatru w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie	67 000,00	67 000,00	100,00%	Rozbudowano zadaszenia sceny amfiteatru o dwie konstrukcje podnoszone za pomocą wciągników łańcuchowych. Plandeka w postaci czterech pasów wsuniętych w prowadnice.
Wykonanie trybuny na boisku w Sarbii	30 000,00	26 813,69	89,38%	Niezadaszona trybuna wykonana z elementów gotowych - siedziska, konstrukcja nośna. Siedziska zamontowane do belki wzdłużnej opartej na słupkach nośnych, profil zamknięty, zabetonowanych do podłoża. Siedziska wykonane z tworzywa PCV w ilości 174 sztuki.
Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	17 000,00	16 509,12	97,11%	Zakupiono kosiarkę samojezdną - Traktorek X305R John Deere
Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zakupiono Serwer DELL T110 II E-3-1220 , 4Gb Ram

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

92695 - Pozostała działalność **12 441,45**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Opis realizacji
Sołectwo Grzybowo	12 450,00	12 441,45	99,93%	zakup siłowni parkowych zewnętrznych

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Przebudowana ul. Poziomkowa w Korzystnie



Przebudowana droga w Rościeniec ul. Zgodna

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Przebudowana ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie



Chodnik w Kądzielnie

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH




Chodniki przy drogach powiatowych – chodnik w Przećminie



Drogi z płyt - Ul. Malinowa w Grzybowie

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

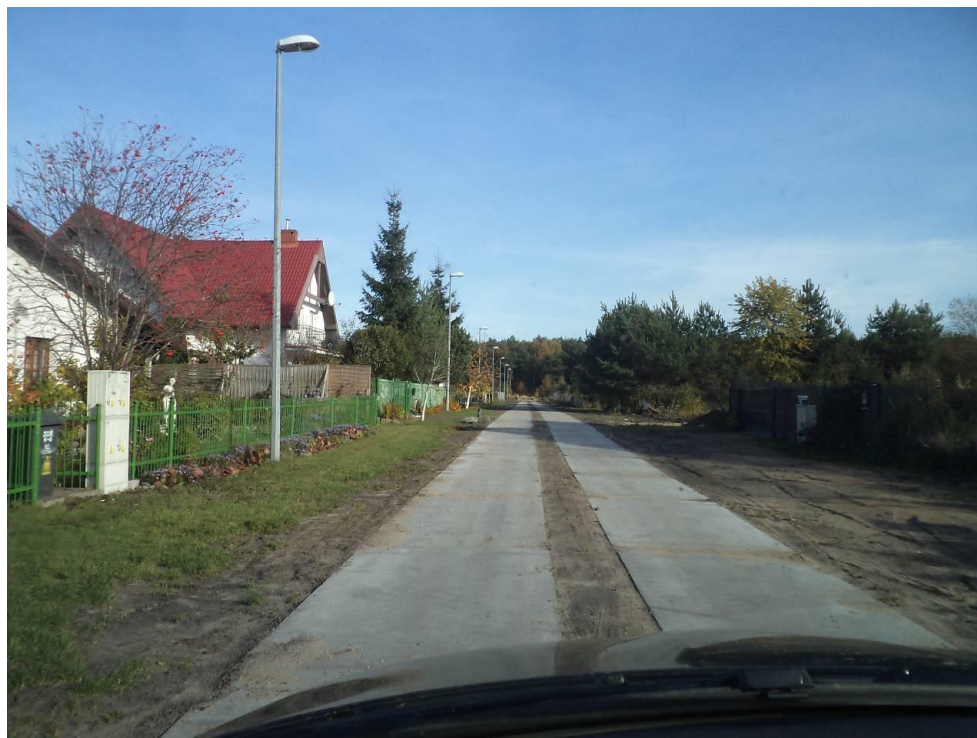

Drogi z płyt - Ul. Gajowa w Grzybowie



Drogi z płyt - Ul. Wiosenna w Grzybowie

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Drogi z płyt - Ul. Kotwiczna w Grzybowie



Drogi z płyt - Ul. Wypoczynkowa w Zieleniewie

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Przebudowana ul. Topolowa w Budzistowie



Przebudowana ul. Brzoskwiowa w Zieleniewie

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Przebudowana ul. Morełowa w Zieleniewie



Przebudowana ul. Porankowa w Niekaninie

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Przebudowana ul. Spokojna w Niekaninie



Przebudowana ul. Perłowa w Niekaninie

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Przebudowana ul. Borkowska w Grzybowie



Przebudowana ul. Ogrodowa w Grzybowie

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Ścieżka rowerowa Zieleniewo – Przećmino



Ścieżka rowerowa Zieleniewo – Przećmino

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Ogrodzenie boiska w Zieleniewie



Modernizacja nawierzchni placów i chodników na terenie szkół w Drzonowie

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Rozbudowa świetlicy w Grzybowie



Budowa świetlicy w Rościeniu

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Modernizacja świetlicy w Zieleniewie



Oświetlenie ul. Bażanciej w Zieleniewie

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



Oświetlenie drogi w Głowaczewie
